

**AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW**Erkend **CONTROLEORGANISME**

Maatschappelijke zetel : Ketelstraat 111 – 3454 Rummen

Tel. 0483/429830

E-mail bureel@asc-controle.be

BTW BE 0826-131-776

IBAN BE 32 7512 0493 7802



Agent-bezoeker belast met het onderzoek : Peeters Tim TP

**VERSLAG VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING**

AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN
CONTROLEBEZOEK :	BOEK 1 - KB 08/09/2019
	6.5.1 t/m 6.5.7.1

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN

* Datum onderzoek	02/08/2022	Verslag nummer	Tp2022-0580
* Adres installatie	Donkerstraat 52 3400 Neerwinden		
* Eigenaar of DNG	Davina Bottu		
* Installateur	SDK Electrics bvba	BTW	BE 0830.407.397
* DNB	Fluvius	EAN Code	-
Type van de lokalen	Wooneenheid : Woning Detail : Schema's in bijlage		

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING

Nominale spanning in Volt	400/230	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	4.5
Automaat DNB	40A	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	10
Voedingskabel Hoofdbord Ø	4 x 10 mm ²	Borden	3
Nominale waarde v.d. bescherming v. d. aansluiting	Zie aut DNB	Eindstroombanen	28+6+16
Type aardelektrode	Lus	Type algemene schakelaar	40A 300mA

4.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019)

6.5.1 t/m 6.5.7.1
1 Geen

Eventuele afwijkingen waarmee rekening gehouden werd : Boek 1 – 8.2.1 + 8.2.2**5.- BESLUIT**

1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)
- De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op 02/08/2047 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
- De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het(de) ééndraadschema (s) en situatieplan(nen) werd(en) voor gezien getekend.

6.-UITGEVOERDE CONTROLES

Onderzoek conform interne procedures 23 en werkinstructie E006 op basis van de vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie.	
Identificatie meettoestel : Metrel idmt 06	
6 a	Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.
6 b	Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen....) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen
6 c	Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
6 d	Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting
6 e	Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom tussen 2,5 en 2.75 maal de gevoeligheid van het apparaat.
6 f	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I
6 g	Visuele controle van vast of vast opgesteld elektrisch materieel .dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
6 h	Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
6 i	De overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

7.- Plichten van de Eigenaars, Beheerders, Huurders

7 a	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.
7 b	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
7 c	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
7 d	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

8.- NOTA'S

--

9.- DE AGENT-BEZOEKER BELAST MET HET ONDERZOEK

NAAM & handtekening	<i>Peeters Tim TP</i>
---------------------------	-----------------------

400/2300
404

284 6 + 1/6

VERDEEELBORD 1

DAVINA BOTTU

A.S.C.
St. Jlaan 18A
15 Haler
1188/429 830
28/10/2014

DOSSIER Nr. : .	blad nr.	index	Datum	Geek.	index	Datum	Geek.
PLAN Nr. : 1	BLAD	1	20/10/14				
ACAD FILE : DWG	Tot	BLAD	3				

Onderwerp: VERDEELBORD1 - KELDER
Projekt: DAVINA BOTTU
Donkerstraat 52 - 3400 Londen - Neerwinden

be 0819577348


ad hofmail com

Verdeelbord meterkast

XVBSG10²-5m

40A/Δ300mA

A26

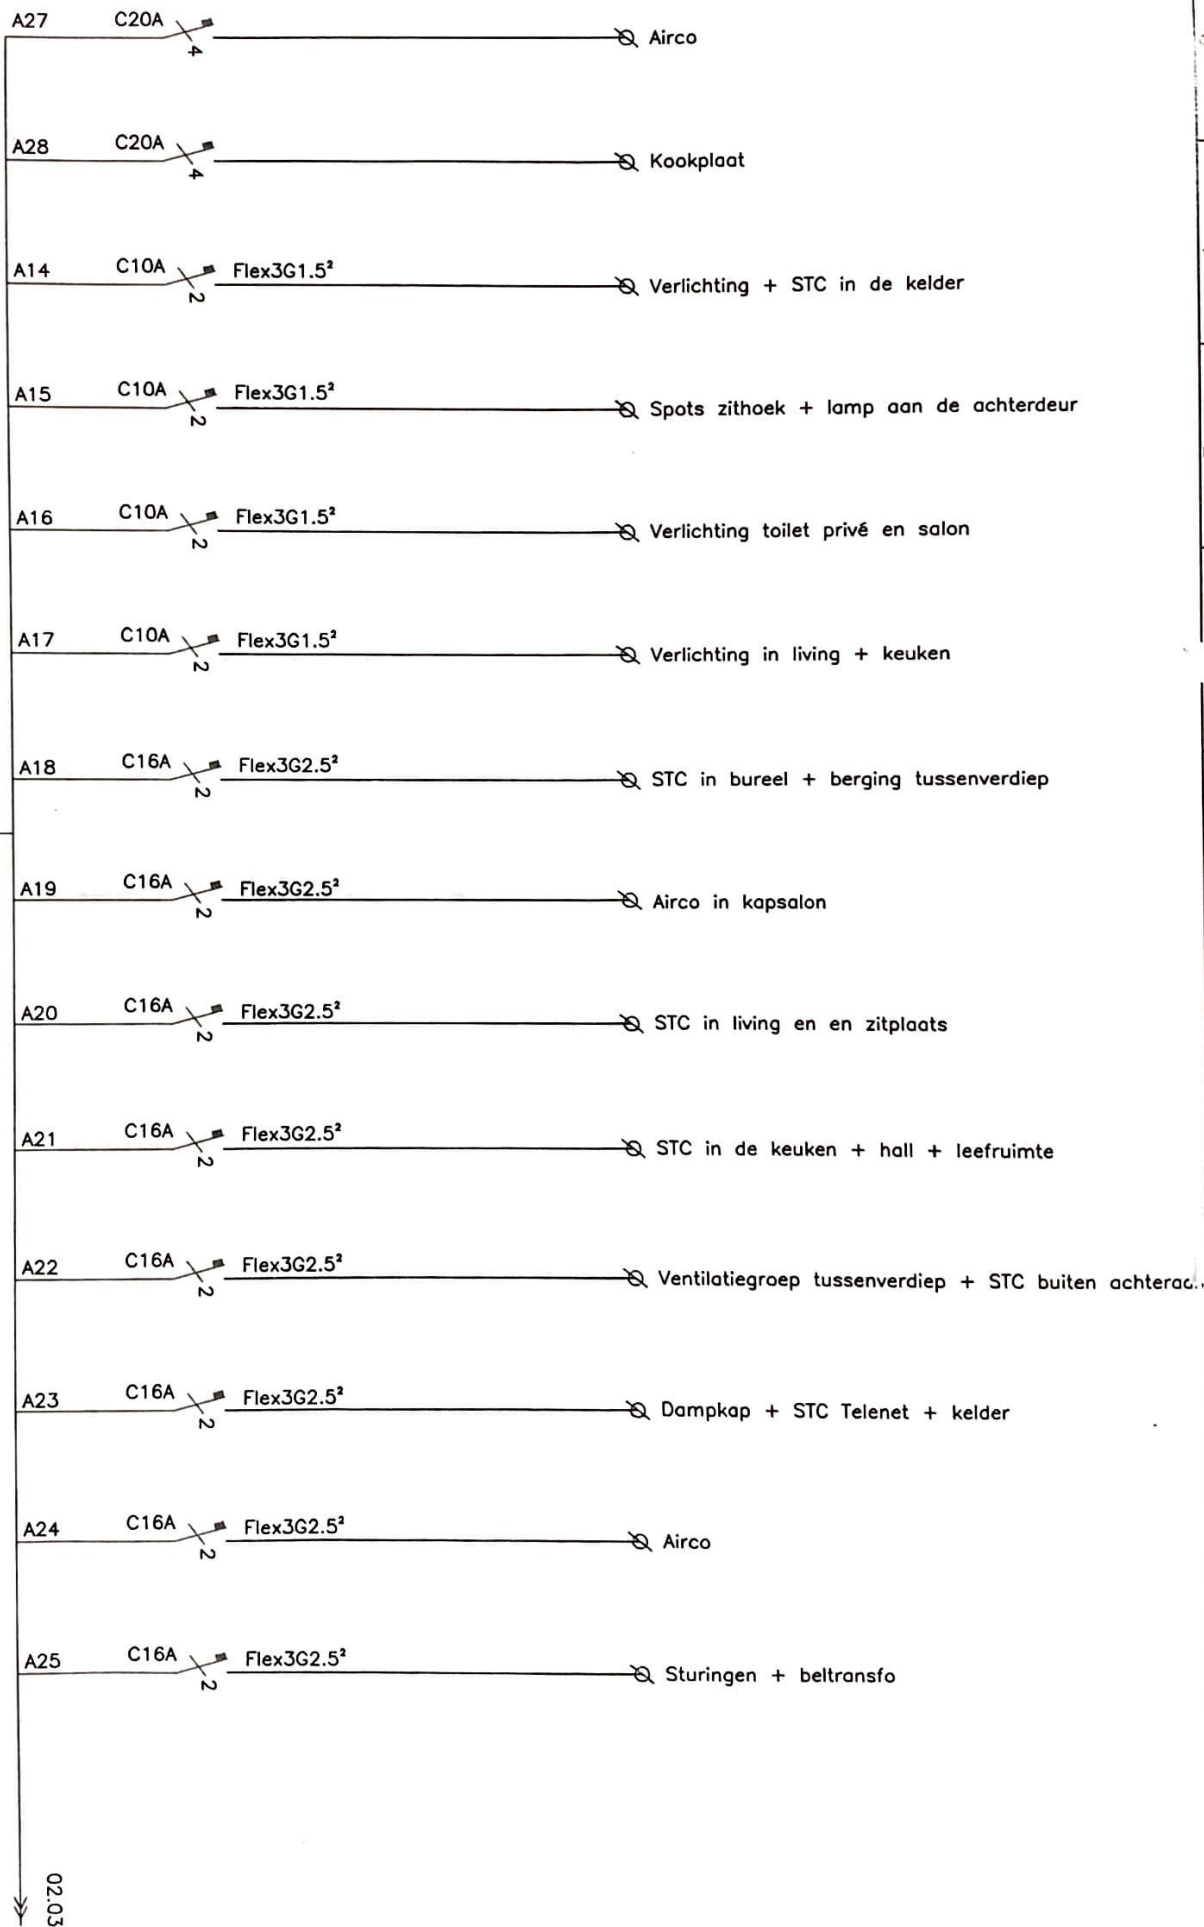

02.03


DOSSIER Nr. : .
 PLAN Nr. : 1
 ACAD FILE : DWG

blad n°. Index
 BLAD 2
 Tot. TOT 3

Datum 20/10/14
 Gelek. Index
 Datum
 Gelek.

Onderwerp: VERDEELBORD1-KELDER
 Projekt: DAVINA BOTTU
 Donkerstraat 52 - 3400 Landen-Neerwinden

02.03
40A/Δ30mA
A29

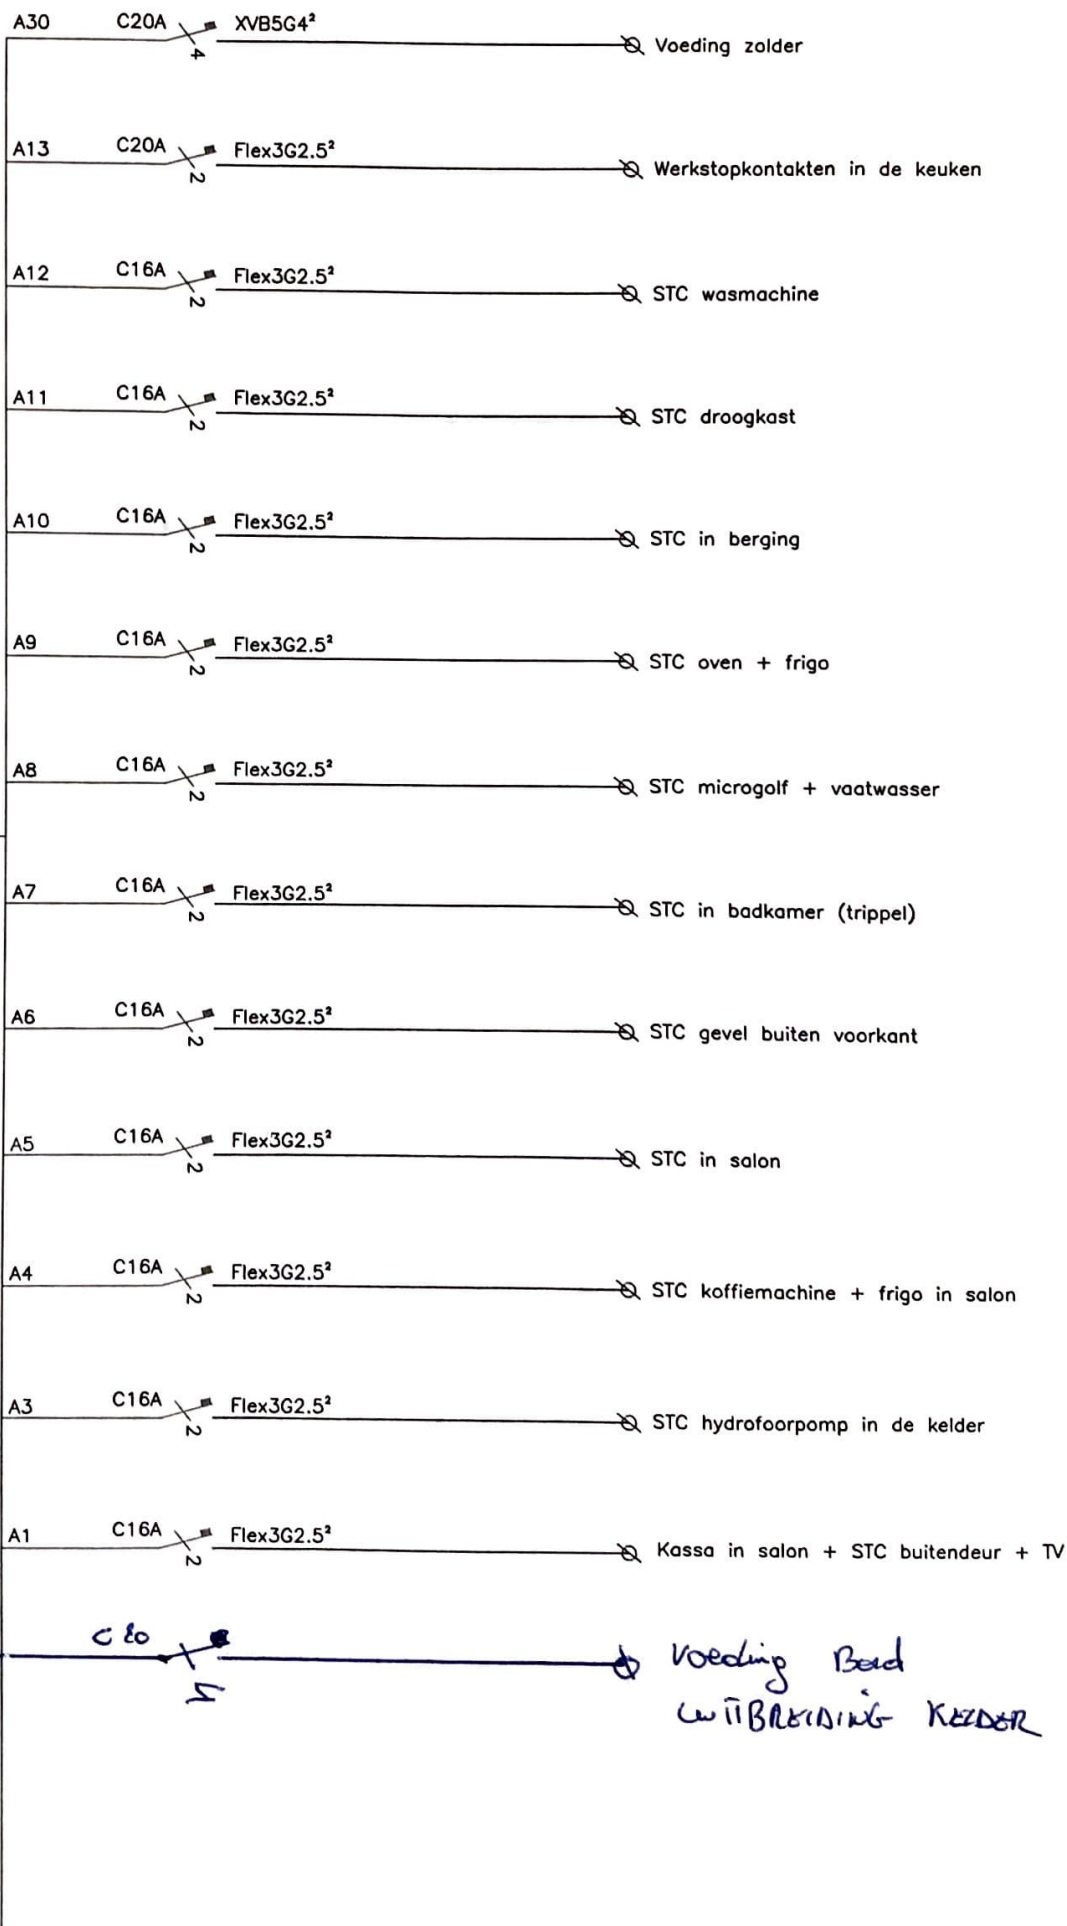

DOSSIER Nr. : . .
PLAN Nr. : 1
ACAD FILE : DWG

blad nr.
BLAD 3
Tot. TOT 3

Index
3
Datum
20/10/14
Getek.
Index
Datum
Getek.

Onderwerp: VERDEELBORD1-KELDER
Project: DAVINA BOTTU
Donkerstraat 52 - 3400 Londen-Neerwinden




VERDEEELBORD 2

DAVINA BOTTU

DOSSIER Nr. : .					
PLAN Nr. : 1					
BLAD					
blad nr.	index	datum	getek.	index	datum
1	20/10/14				
Tot					
BLAD					
2					

Onderwerp: VERDEEELBORD2-ZOLDER
Projekt: DAVINA BOTTU
Donkerstraat 52 - 3400 Landen-Neerwinden

ACAD FILE : DWG

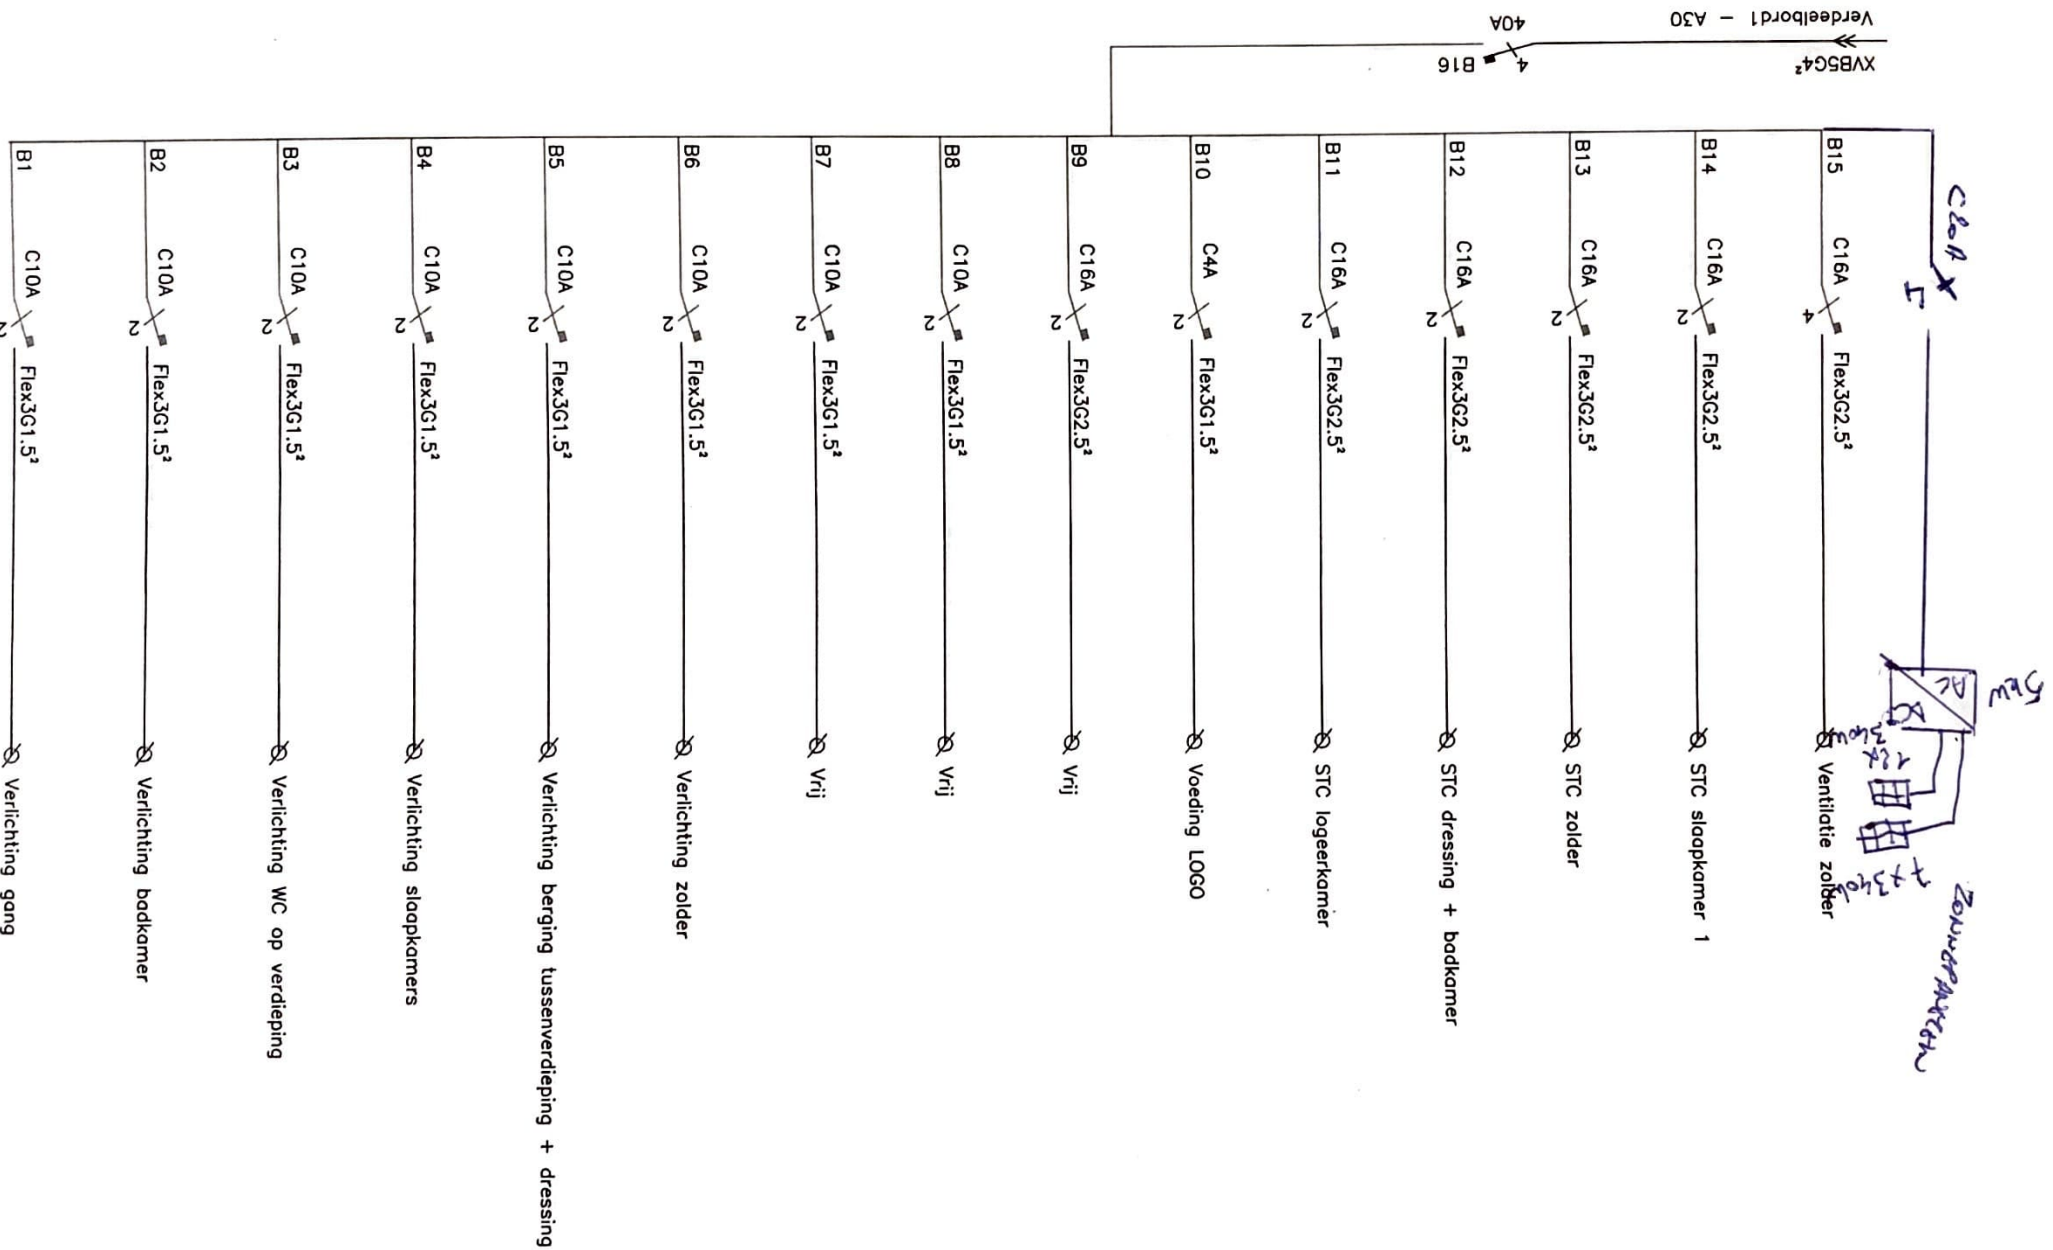

DOSSIER Nr. : .	PLAN Nr. : 1	ACAD FILE : DWG
blad nr.	BLAD	Tot
Index	2	2
Datum	20/10/14	
Gelek.		
Index		
Datum		
Gelek.		

Onderwerp: VERDEELBORD2-ZOLDER
 Projekt: DAVINA BOTTU
 Donkerstraat 52 - 3400 Landen-Neerwinden

Erkend Organisme

A+S°C.
Singellaan 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
e-mail: bureel@asc-controle.be


Plaats van de elektrische installatie
Botu Davina
Donkerstraat 52
3400 Landen-Neerwinden

Installateur
Elektra -M B.V.B.A.
Nem 28
3320 Hoegaarden
Tel.: 016 76 65 98
e-mail: info@elektra-m.be
BTW BE 0462.785.218

[Handwritten signature]

3x4x4 v.

P. 1/3
Eendraadschema

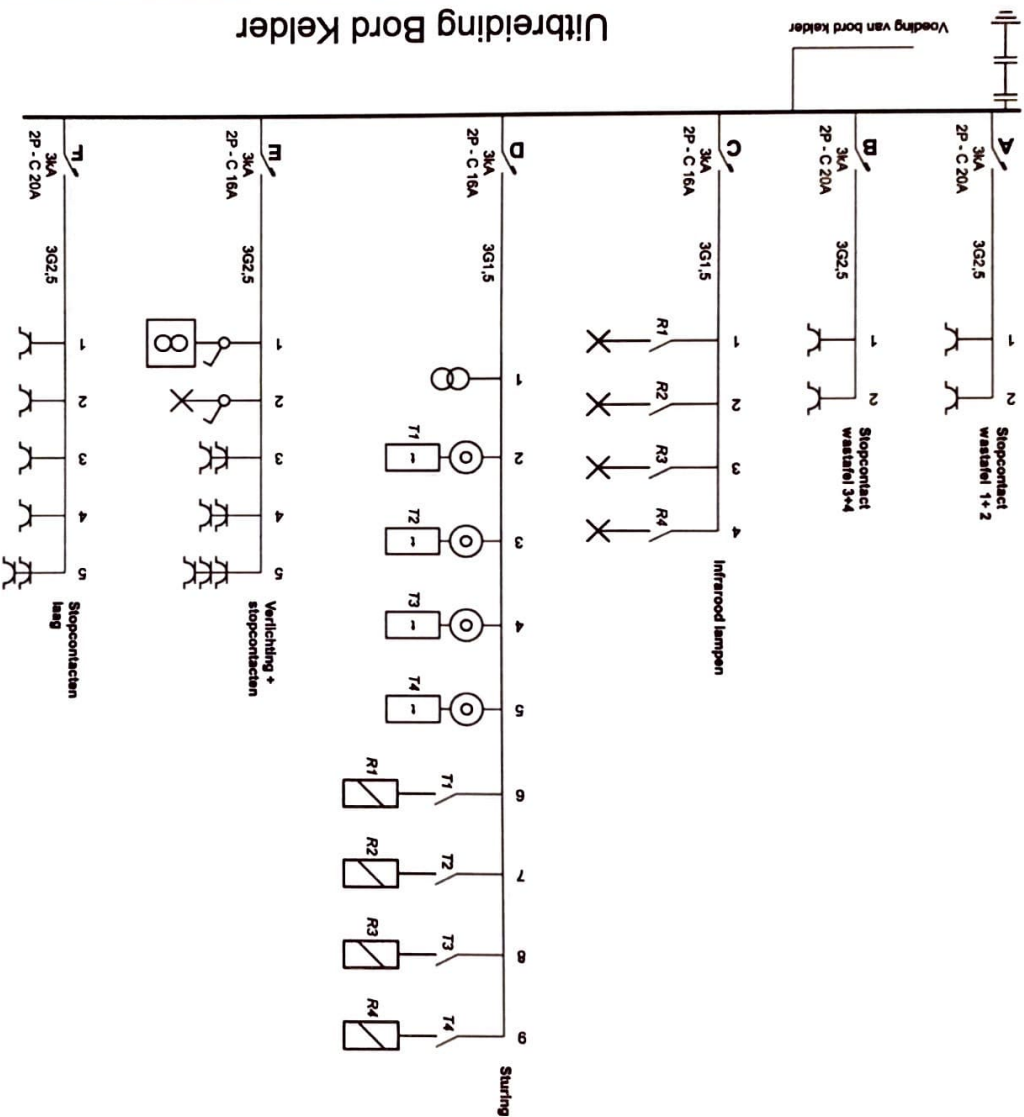

Erkend Organisme
A.S.C.
Singellaan 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
e-mail: bureel@asc-control.be


Plaats van de elektrische installatie
Bottu Davina
Donkerstraat 52
3400 Landen-Neerwinden

Installateur
Elektra-M.B.V.B.A.
Nerm 28
3320 Hoegaarden
Tel.: 016 76 65 98
e-mail: info@elektra-m.be
BTW BE 0462.785.218

[Handwritten signature]

Exhibit N

p. 2/3
Situatieschema

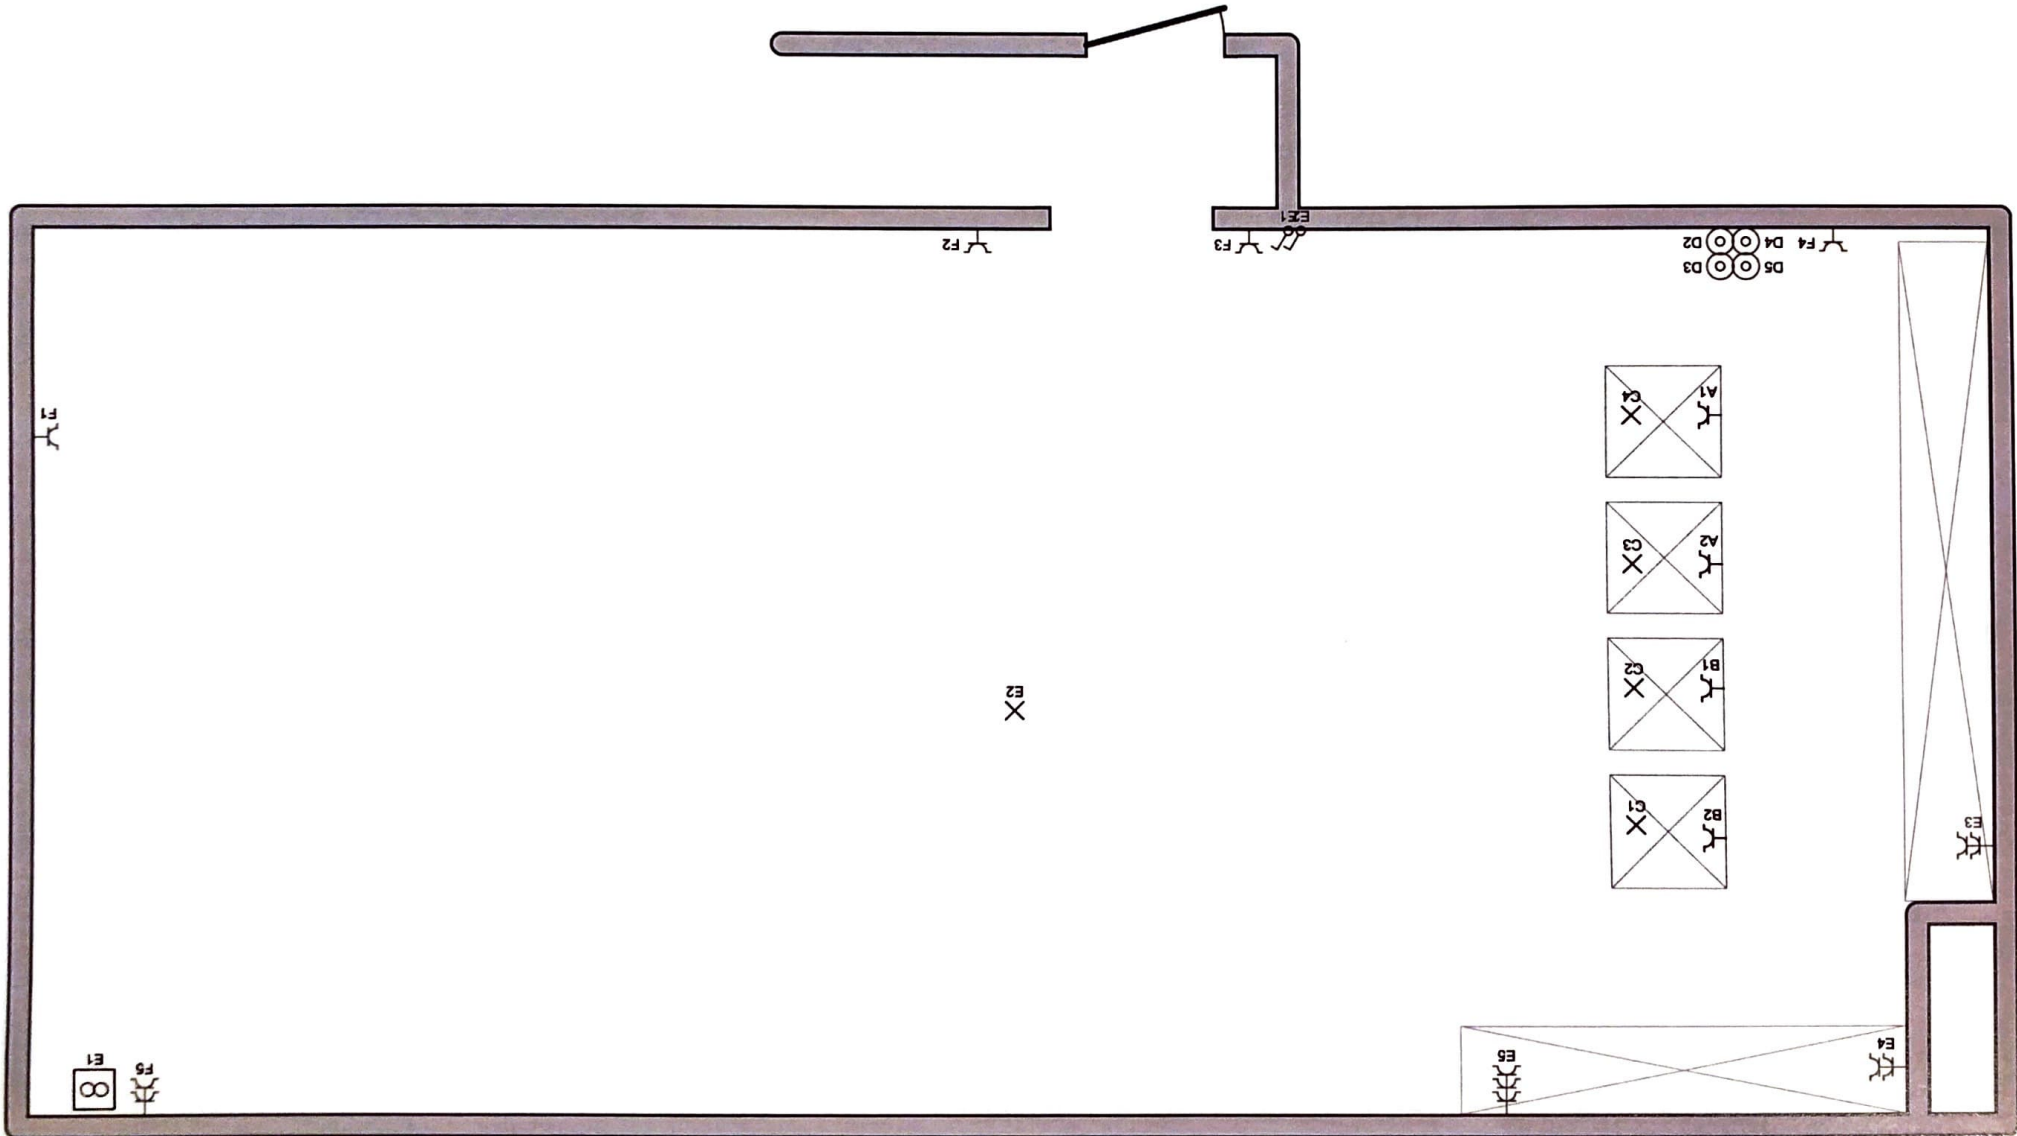

- A Stopcontact wastafel 1+ 2
- B Stopcontact wastafel 3+4
- C Infrarood lampen
- D Sturing
- E Verlichting + stopcontacten
- F Stopcontacten laag

Erkend Organisme
A*SC
Singellaan 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
e-mail: bureel@asc-controle.be

Plaats van de elektrische installatie
Botlu Davina
Donkersstraat 52
3400 Landen-Neerwinden







Installateur
Elektra-M.B.V.B.A.
Niem 28
3320 Hoegaarden
Tel.: 016 76 65 98
e-mail: info@elektra-m.be
BTW BE 0462.785.218



p. 3/3
Lijst Kringen

3X400 TN

Vergeelbord 1 - kelder



Benamingslijst

- A1: Kasja in salon+STC buitendeur+TV
- A2: Vrije positie
- A3: STC Hydrofoomp in de kelder
- A4: STC kofie+ frigo in salon
- A5: STC in salon
- A6: STC gevel buiten voorkant
- A7: STC in badkamer (trappe)
- A8: STC microgolf + vaatwasser
- A9: STC oven + frigo
- A10: STC in berging
- A11: STC droogkast
- A12: STC wasmachine
- A13: Werkstopcontacten in de keuken
- A14: Verlichting + STC in de kelder
- A15: Spots zithoek + lamp achterdeur
- A16: Verlichting toilet privé + salon
- A17: Verlichting in living + keuken
- A18: STC in bureau + berging tussenvoerd
- A19: Aluco in kapsalon
- A20: STC in living en zitplaats
- A21: STC in keuken + hall + leefruimte
- A22: Ventilatiegroep tussenvoerdiep + STC buiten achteraan
- A23: Dampkap + STC Teleret + kelder
- A24: Aluco
- A25: Sturingen + behranto
- A26: Algemene differentieel 0.3A
- A27: Aluco
- A28: Koelkast
- A29: Differentieel 0.03A
- A30: Voeding zolder
- A31: Behranto voor het salon

Verdeelbord 2 - Zolder

 12-24 RC	 DM 16ZAR	 DM 8	 D8	 D7	 D8	 D9
 Niko	 Niko	 Niko	 Niko	 Niko	 Niko	 Niko
 Niko	 Niko	 Niko	 Niko	 Niko	 Niko	 Niko

Benamingslijst

B1: Verlichting gang

B2: Verlichting badkamer

B3: Verlichting WC verdieping

B4: Verlichting slaapkamers + dressing

B5: Verlichting berging tussenverdieping

B6: Verlichting zolder

B7: VnĭB8: VnĭjB9: Vnĭj

B10: Voeding LOGO

B11: STC logeerkamer





B12: STC dressing + badkamer

B13: STC zolder

B14: STC slaapkamer 1

B15: Ventilatie zolder

B16: Hoofdschakelaar



Benamingslijst

B1: Verlichting gang

B2: Verlichting badkamer

B3: Verlichting WC verdieping

B4: Verlichting slaapkamers + dressing

B5: Verlichting berging tussenverdieping

B6: Verlichting zolder

B7: VnĭB8: VnĭjB9: VnĭjB10: VcB11: STC logeerkamB12: STC dressing + ba

B13: STC zolder

B14: STC slaapkamer 1


B15: Ventilatie zolder


B16: Hoofdschakelaar


KELDERPLAN

Zie Bijlage Plan

Airco
A19-A24-A27

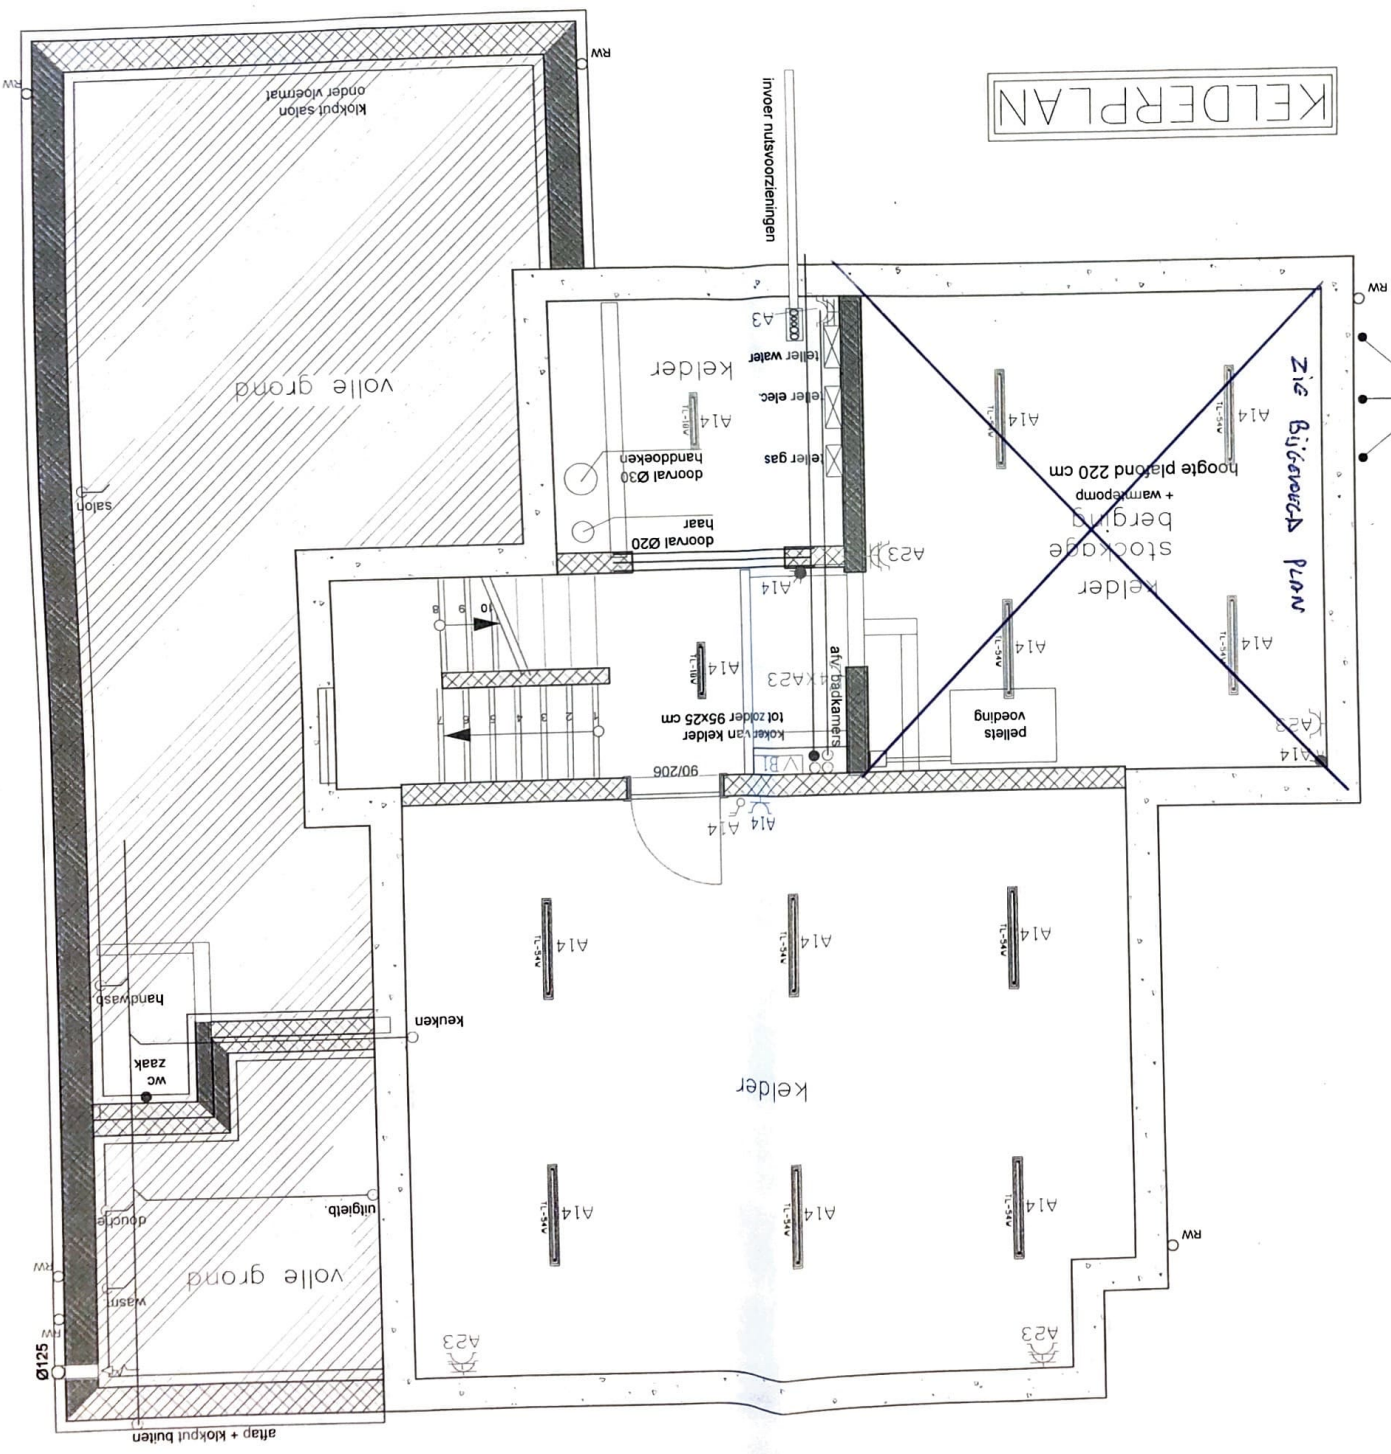

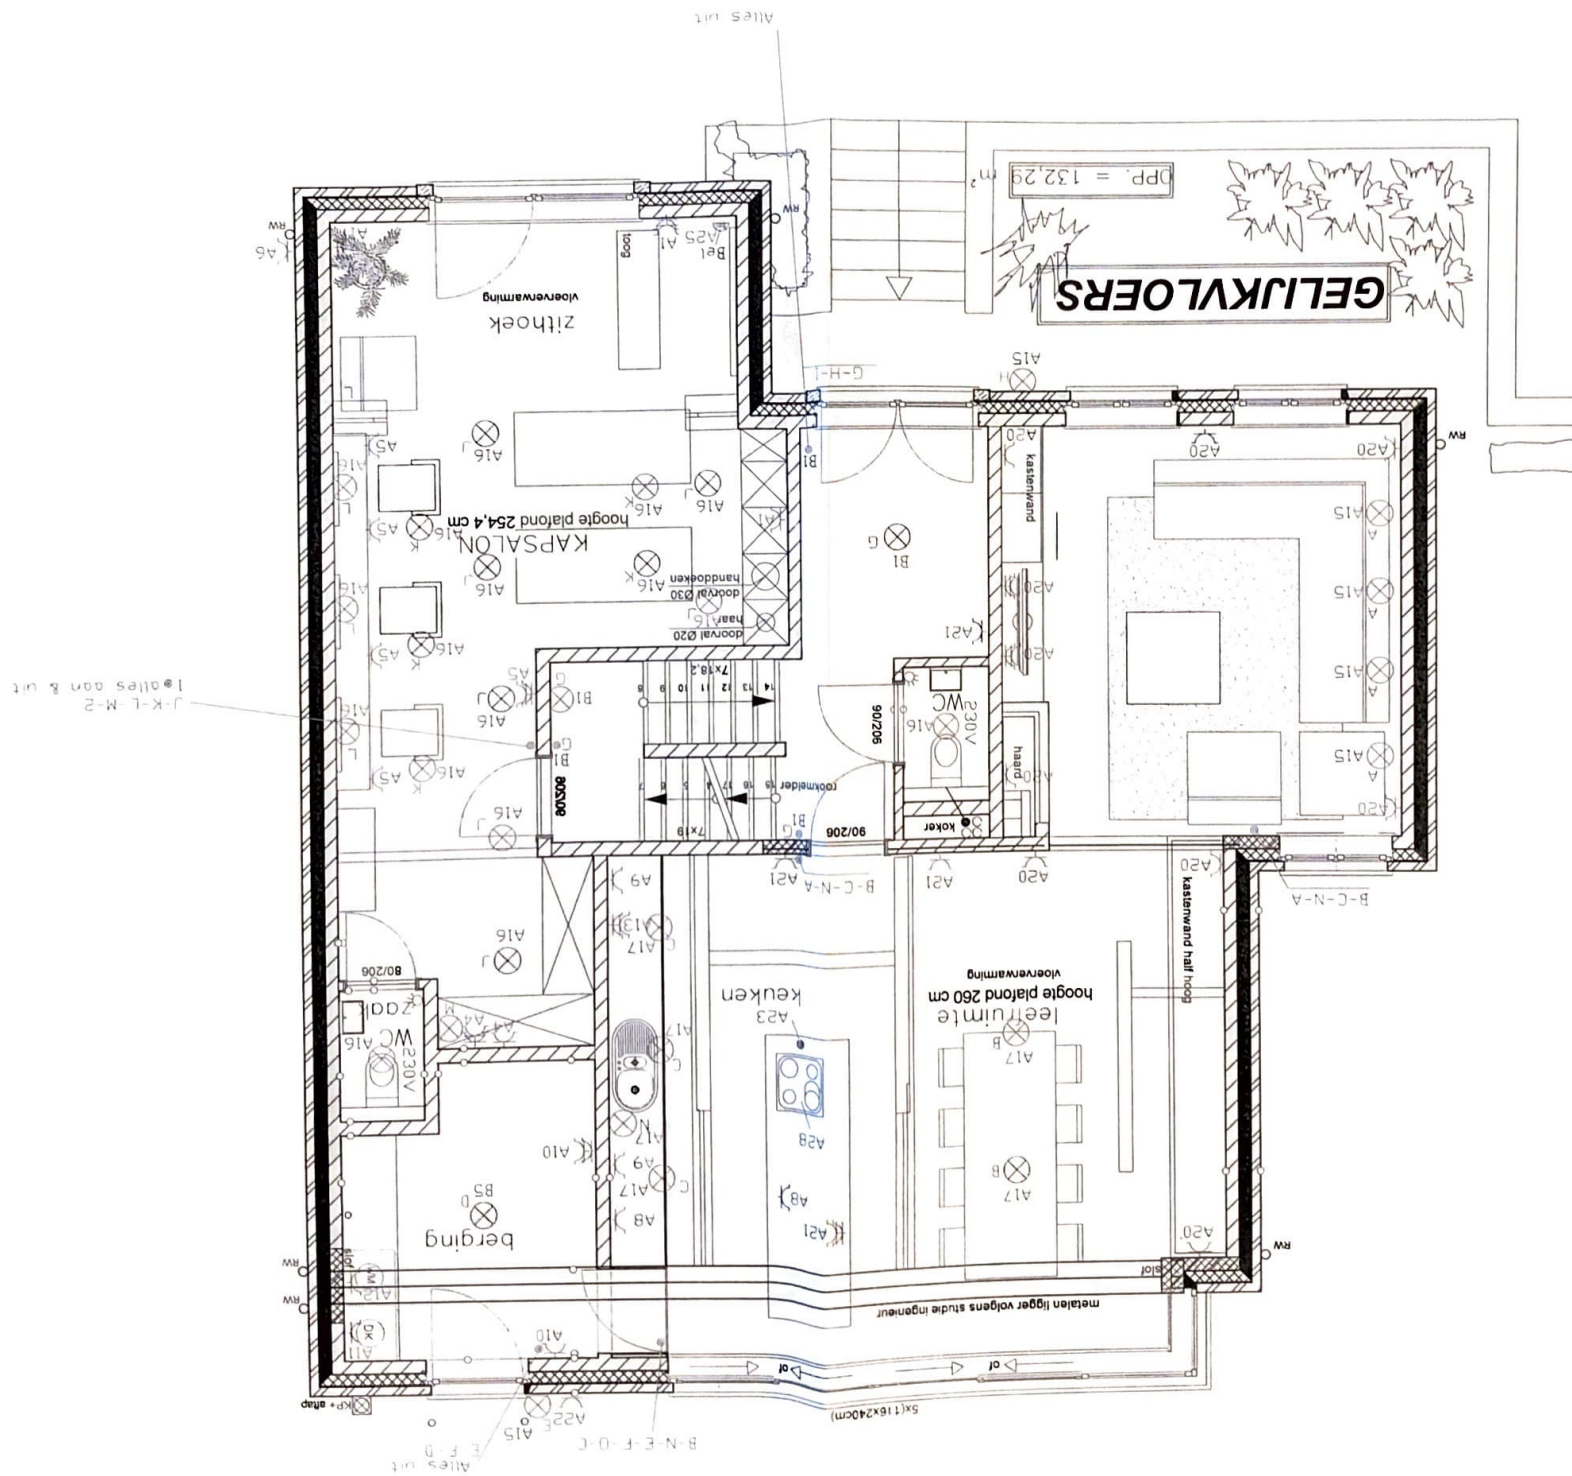

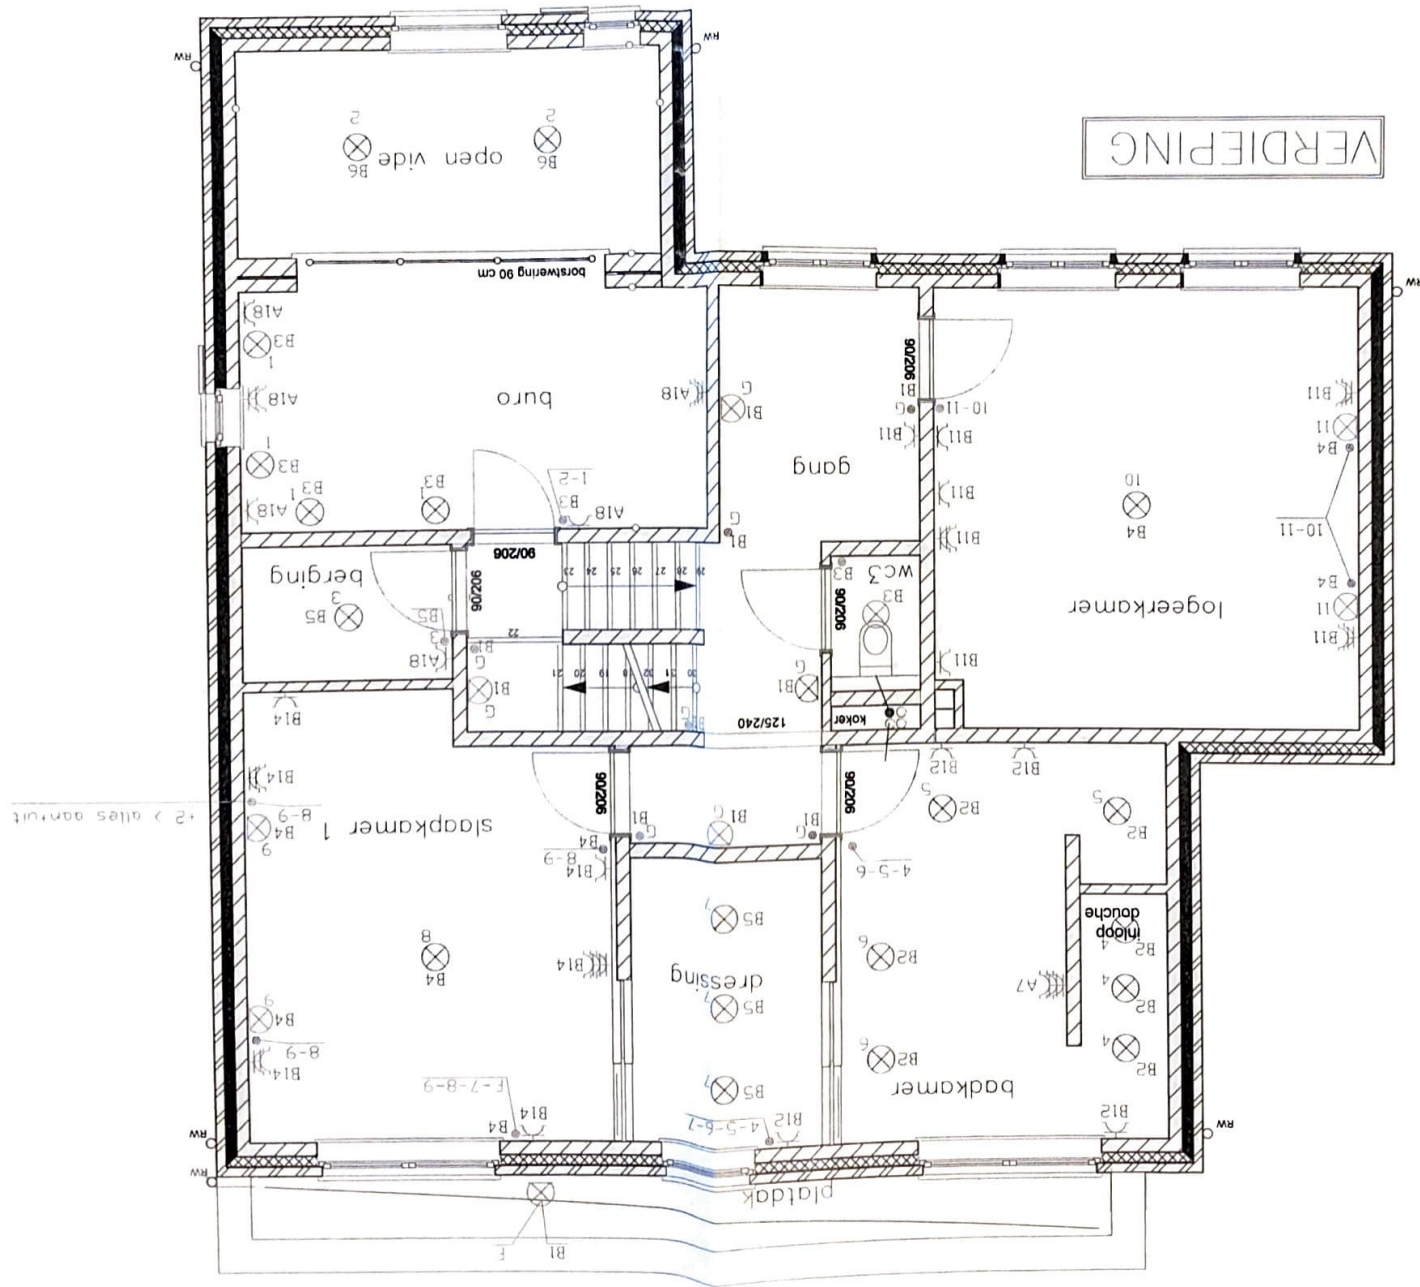

ZOLDERPLAN

